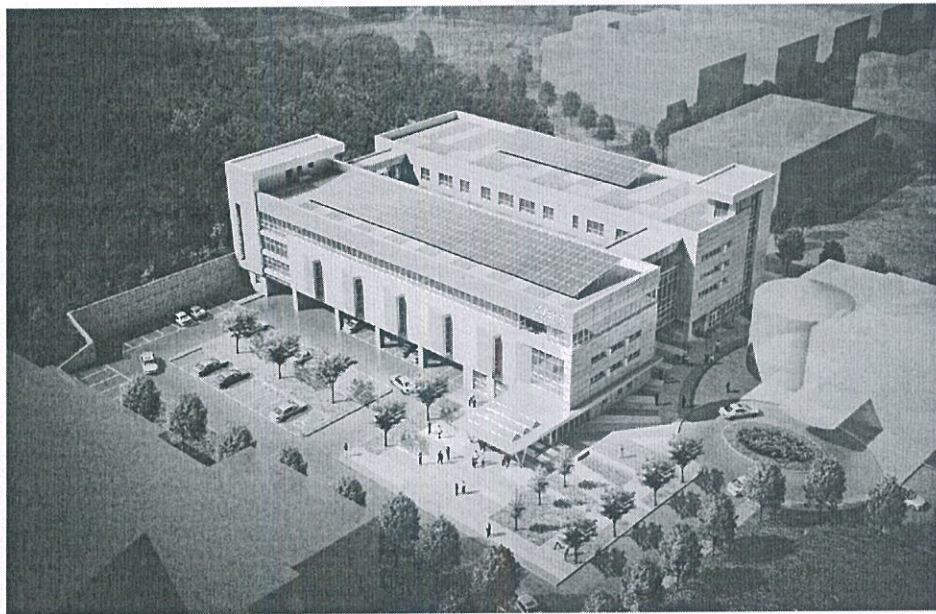


『청렴 속으로! 화합을 향하여!! 최고를 창출하자!!!』

만성 흡입독성 시험시설 증축공사



산업안전보건연구원
화 학 물 질 센 터

① 사업개요

○ 사업명 : 만성 흡입독성 시험시설 증축공사

○ 건설규모 : 지상3층 철근콘크리트조 연구시설

구 분	면 적(m ²)	주요 시설
지상1층	2,340. ⁹³	전기실, 발전기실, 기계실, 공조실, 중앙제어실, 기자재 창고 등
지상2층	2,703. ⁸⁷	만성흡입실험실, 아만성흡입실험실, 급성흡입실험실, 검역실, 세정실, 부검실, 혈액생화학실험실, 생체시료 보관창고 등
지상3층	1,250. ¹⁸	급배기처리실, 만성발생/분석실, 시험물질조제실, 실험물질보관창고, 염색실, 표본제작실, 검체보관실, 기기정비실, 중앙감시실 등
합 계	6,295	

○ 건설공사비 : 20,736백만원

(단위:백만원)

내 역 별	계	연 도 별		
		2013	2014	2015
건설비	20,736	2,200	9,308	9,228


② 사업추진 실적


○ 건설공사 : 추진율 35.²%(12월15일 기준)

- 공정율은 35.²%로 계획(36.⁶%)대비 96.⁰% 추진 중

- '14. 12. 15일 현재 3층 구조물공사 진행 중

○ 월별 주요 실적

월 별	주요 추진 현황	관 련 사 진
3월	- 설계도서 검토 - 건축 인·허가 준비	 
4월	- 벌목 및 토표제거 - 기공식 거행	 
5월 6월	- 터파기 실시 - 흙막이공사	 

월 별	주요 추진 현황	관 련 사 진
7월	- 터파기 완료 - 버림 콘크리트 타설	
8월	- 기초(MAT)공사 - 1층 벽체 거푸집공사	
9월	- 1층 거푸집동바리 설치 - 2층 바닥 단열재 설치	
10월	- 1층 콘크리트 타설 - 2층 벽체 거푸집 설치	
11월	- 2층 콘크리트 타설 - 1층 거푸집 탈형, 해체	

② 사업추진 계획

- 건축 구조물공사 : 3층 구조체공사
- 토목 옹벽(1, 2호) 구조물 공사
- 방수공사 등

③ 사업 담당자

- 소속 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 화학물질센터
- 성명 : 문정범
- 연락처 : 042-869-0332
