


외벽 균열 보수작업 중 달비계 섬유 로프가 탈락되며 떨어짐

공 사 명	00아파트 외벽 보수공사	발생일시	2020년 5월
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	부산광역시 OO구	공사규모	아파트 1개동 균열 보수
재해개요	달비계를 사용하여 아파트 외벽 보수작업 후 내려오던 중 옥상 수도 배관 브라켓(받침대)에 고정된 섬유로프가 빠지면서 달비계 좌대와 함께 화단으로 떨어짐		

재 해 상 황 도

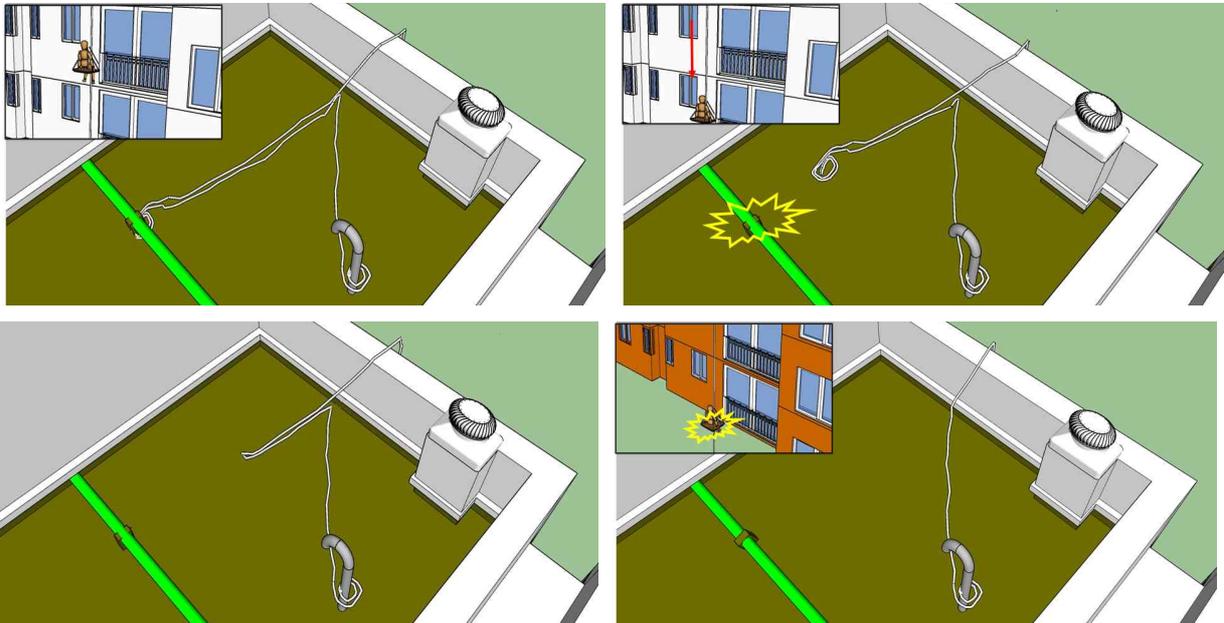

안전대책

- 달비계 달기섬유로프 고정 철저 및 작업시작 전 점검 실시
 - 달비계 달기섬유로프는 콘크리트 구조물 또는 앵커볼트 등 탈락하거나 변형되지 않는 견고한 시설에 풀리지 않도록 고정 철저
 - 달비계 작업을 시작하기 전에 달기섬유로프의 부식, 고정부의 결함 등 달비계의 구조를 점검하고 이상 발견 시 즉시 보수하여 작업
- 수직구멍줄 설치 및 안전대 등 개인보호구 지급·착용 관리 철저
 - 수직구멍줄을 설치하고 안전대, 안전모를 지급하여 달비계 탑승 전에 안전대(추락방지대)를 체결하고 안전모를 착용하고 작업토록 관리 철저
