


우수관 설치작업 중 회전하는 우수관과 토사면 사이에 끼여 사망

공 사 명	○○건설(주) ○○○○공사현장	발생일시	2018. 5.
재해형태	끼임	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 소재	공사규모	연장 0.0km
재해개요	2018.05. 경 직영근로자인 재해자가 우수관 배치작업 중 마지막 우수관을 굴삭기로 당겨 끼워넣던 중 순간적으로 우수관이 빠지면서 회전하는 우수관과 토사면 사이에 재해자의 가슴이 끼여 치료 중 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

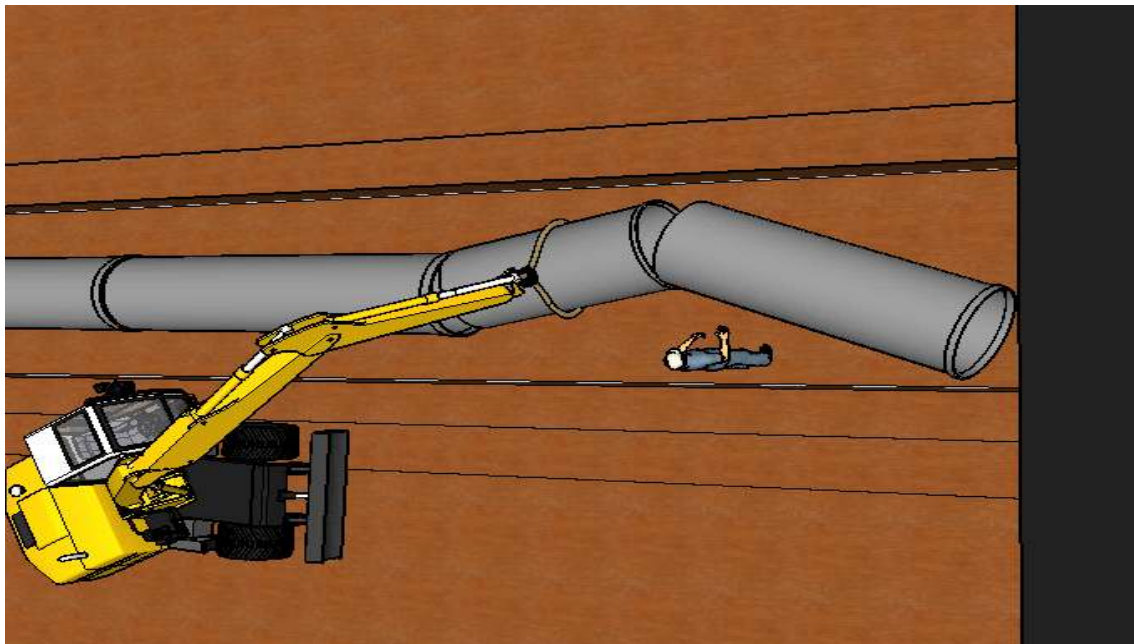

안전대책	○ 안전한 작업방법 사용 - 우수관 배치작업시 굴착면을 여유있게 굴착하여 순차적으로 우수관을 배치하는 안전한 작업방법을 사용 ○ 작업계획서 작성 및 준수 - 우수관과의 협착위험을 예방하기 위해 위험반경 내 근로자의 출입을 금지하고, 레버플러 또는 체인블럭 등 정교한 작업이 가능한 수공구를 사용하는 등 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 준수
------	---
