


슬래브 단부에서 철근마무리 작업 중 추락 사망

공 사 명	00리 000 빗물이용시설 설치공사	발생일시	2018.03.29(목) 16:00경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	제주시 00읍 00리	공사규모	지하1층 물탱크
재해개요	2018년 03월 29일(목) 16:00경 00읍 00리 소재 빗물이용 시설공사 (지하물탱크 신축)현장에서 피해자가 물탱크 상부 슬래브 단부에서 철근배근 마무리 작업을 하던 중 슬래브 단부에서 굴착 저면으로 떨어져(높이 : 약 3.5m)사망한 것으로 추정되는 재해임		

재해상황도

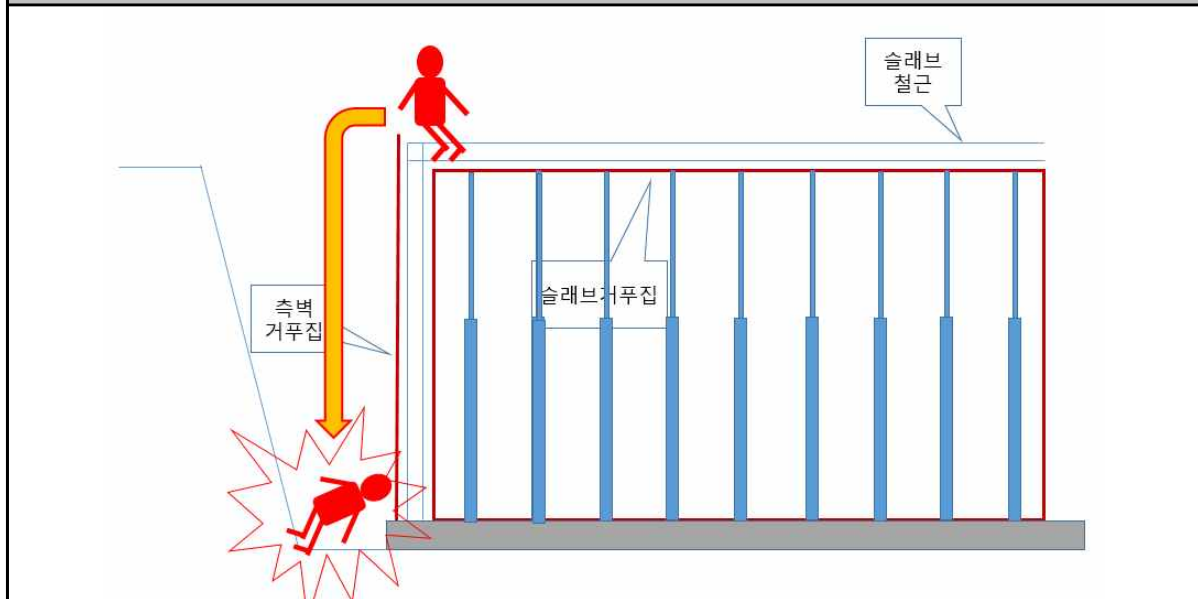

안전대책	- 추락방지조치 실시 · 슬래브 단부 등 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치하여 작업해야하며, 안전난간을 설치하기 곤란한 경우에는 안전대 부착 설비를 설치하고, 안전대를 착용 · 부착하여 작업하도록 하여야 함 - 개인보호구 착용(안전모, 안전대) 및 부착설비 설치 · 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서의 작업 시 안전모를 지급하고 착용토록하고 작업하여야 함
------	---
