


철골 상부에서 이동 중 안전대 미 부착(체결)로 추락(H=7.5m)


공 사 명	OO 연구소 및 근생시설 신축공사	발생일시	2017.10.28(토) 12:05분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	부산광역시 기장군 일광면 일원	공사규모	지상4층 철콘 1개동, 지상 1층 강구조물 1개동
재해개요	○ 2017년 10월 28일(토) 12시05분경, 부산 기장군 일광면 소재 OO종합 건설(주)에서 시공중인 「OO 연구소 및 근생시설 신축공사」 현장에서 ○ 재해자가 연구동(B동)의 상부 철골 트러스 조립작업을 마치고 철골 트러스를 잡아주던 줄걸이를 해체한 후 ○ 다음 작업을 위해 철골 트러스 상부에서 이동하던 중 몸의 중심을 잃고 지상 약 7.5m 아래 콘크리트 바닥으로 추락하여 ○ 부산 해운대 OO병원으로 후송하였으나, 당일 14:05분경 사망한 재해임		

재 해 상 황 도

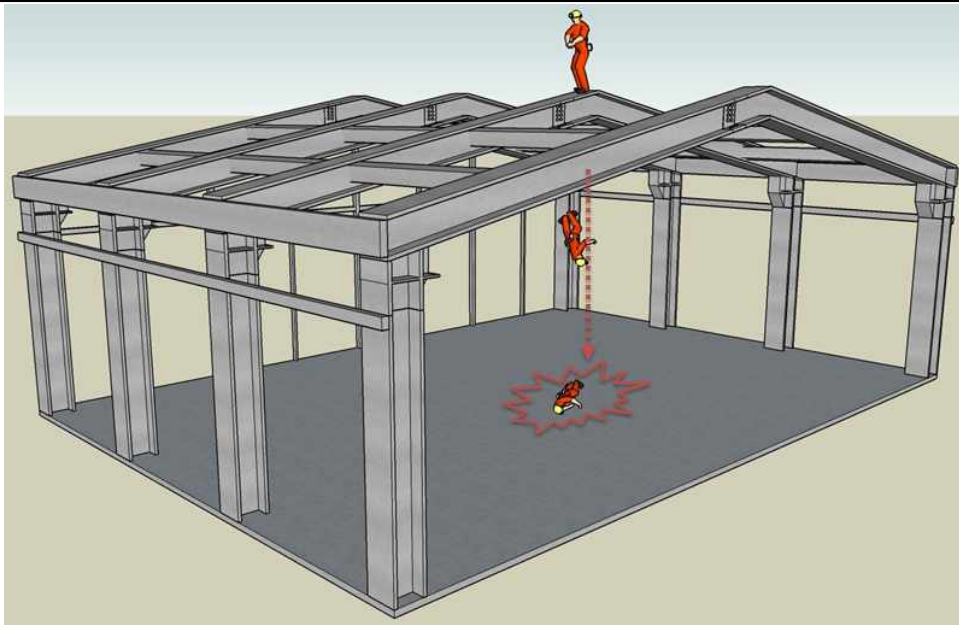

안전대책


- 철골 조립 작업 시 안전대 부착설비 설치 후 안전대 부착 철저
 - 철골 조립작업 시 근로자의 추락방지를 위하여 철골부재 조립 전 지상에서 안전대 부착설비 설치 후 인양하여 조립하고, 철골부재 상부에서 작업(또는 이동) 시 미리 설치된 안전대 부착설비에 안전대를 부착한 상태에서 작업(또는 이동)하여야 함.

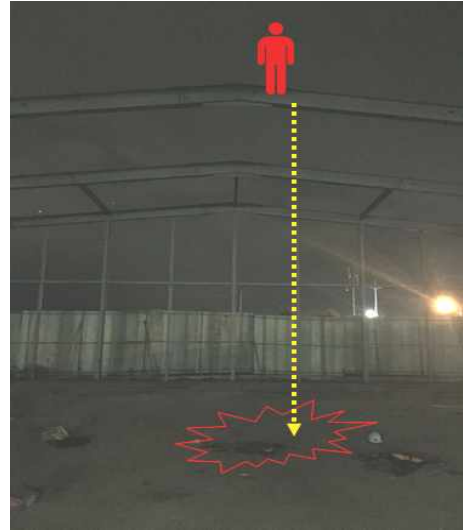

현장 전경(안전대 부착설비 및 안전방망 미설치)



재해발생 후 안전대 부착설비 및 안전방망 설치 전경

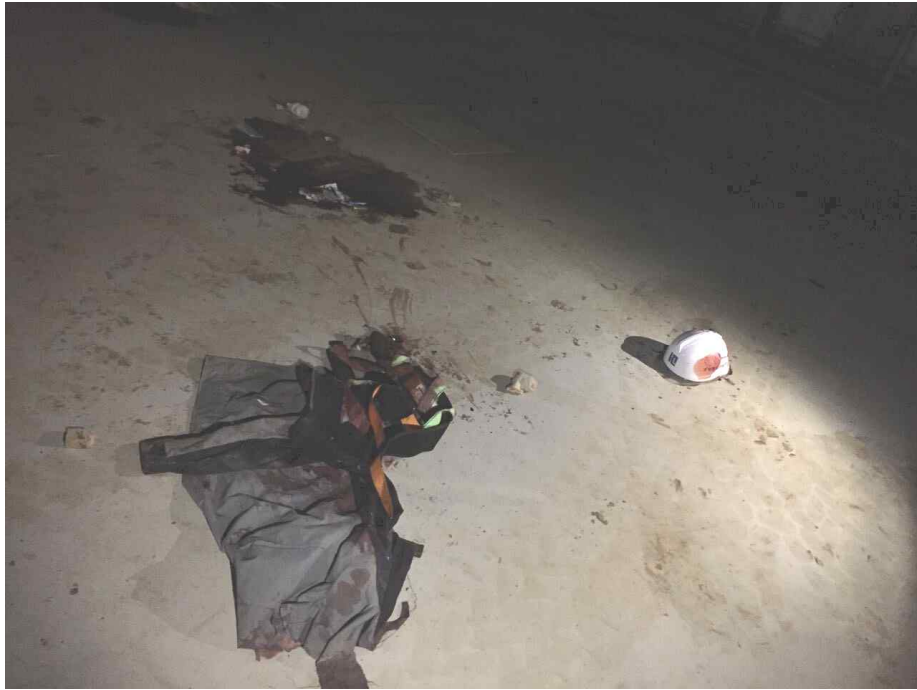

재해자가 착용한 안전모 및 안전대



재해발생 당일 오전, 작업을 위해 운반한 C형강 자재
