


보 거푸집 설치작업 중 떨어짐

공사명	○○ ○○ 신축공사	발생일시	2019.03.10.(일) 15:32경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	인천시 서구	공사규모	지하4층 지상11층 1개동
재해개요	2019. 03. 10.(일) 15:32경 인천 서구에 소재한 ○○건설(주)이 시공 중인 「○○ ○○ 신축공사」 현장에서 협력업체 ○○건설(주) 소속 근로자인 ○○○(만48세, 남, 형틀공)이 지상1층 보(0.5m×0.8m)상부에 서서 측면 거푸집(0.3m×1.2m) 조립 작업 중, 몸의 중심을 잃고, 지하1층 바닥(H≒3.6m)으로 떨어져 병원으로 후송 치료 중 2019. 03. 18.(월) 23:10경 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

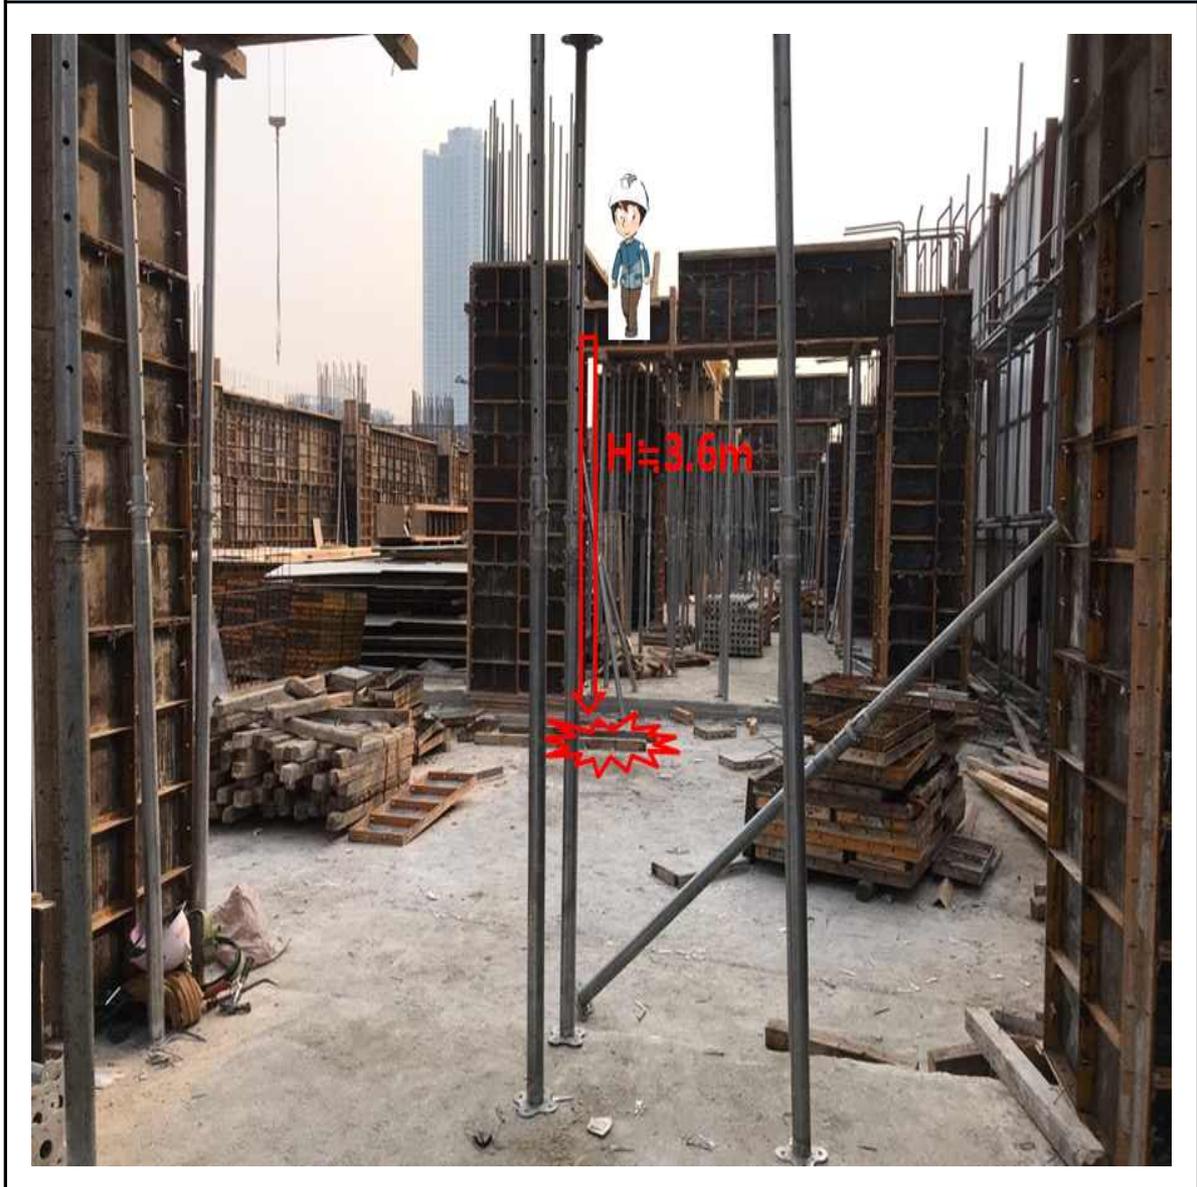

안전대책

○ 추락의 방지 철저

- 사업주는 보 거꾸집 설치 작업 등 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 함.

○ 안전대의 부착설비 설치 및 고리 체결 철저

- 사업주는 보 거꾸집 설치 작업 등 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 하고,
- 이러한 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 이상유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 함.
