


하수처리장 흙막이가시설 피장 용접작업 중 굴삭기 버킷에 맞음

공 사 명	00하수처리장건설공사	발생일시	2020.7.12(일) 07:45분경
재해형태	맞음	재해정도	사망 1명
소 재 지	○○도 ○○시 ○○로	공사규모	하수처리장 1개동, 중계펌프장 2개동
재해개요	2020. 7. 12(일) 07:45경 ○○ ○○시 ○○로 소재 (주)○○건설 공공 하수처리시설(증설)건설공사 현장에서 굴착지반 면고르기 작업을 위해 굴삭기 버킷과 철재 플레이트(1400×450×40)의 용접작업 중 버킷이 굴착 사면 하부(H≒1.0m)로 굴러내려가 흙막이가시설 6단 띠장 흠뻑우기 용접작업 중이던 재해자를 강타하여 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

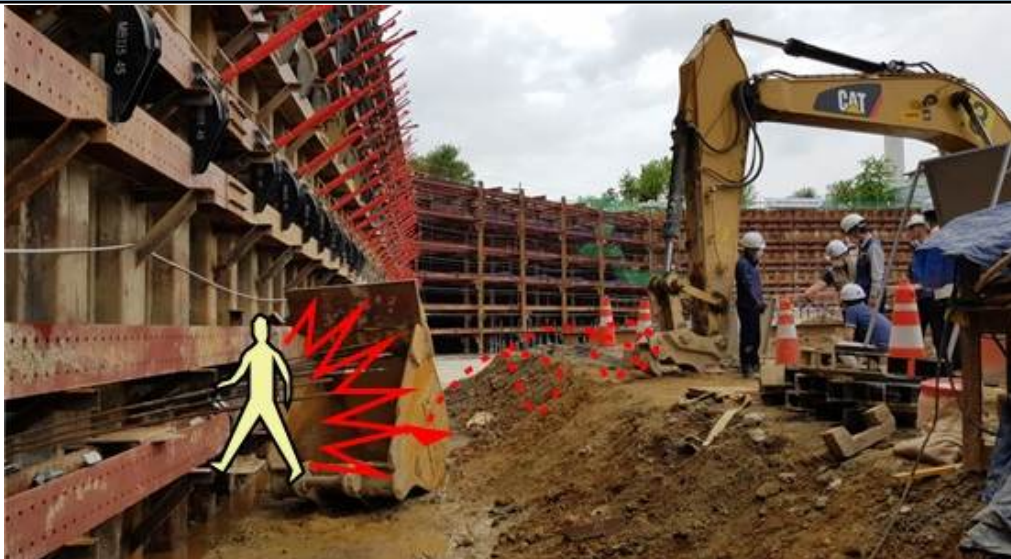

안전대책	○ 작업지휘자 지정 및 지휘 실시 - 사업주는 차량계 건설기계의 수리나 부속장치의 장착 및 제거 작업을 하는 경우 그 작업을 지휘하는 사람을 지정하여 작업 순서 및 안전한 작업을 지휘하는 등 필요한 조치를 하여야 함. ○ 접촉 방지 실시 - 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 해당 장비에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에는 근로자를 출입시키지 말고 유도자를 배치하는 등 접촉 방지조치를 하여야 함.
------	---
