


보안등 높이 조절을 위해 전주에 승주하여 작업 중 떨어짐

공 사 명	2015년도 ○○지역본부 고압C공사	발생일시	2016.05.31. 11:40
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	전남 무안군 현경면	공사규모	고,저압선로 신설 및 변압기 교체 등
재해개요	농사용(울) 5kW 신설 설치공사 현장에서 전주상 보안등 위치를 조정하여 변압기 설치 공간을 확보하고자 14m 전주의 약 5.8m지점까지 승주하여 U자 걸이용 안전대를 걸려는 과정에서 추락하여 병원으로 후송, 치료 중 사망한 재해임		

재 해 상 황 도

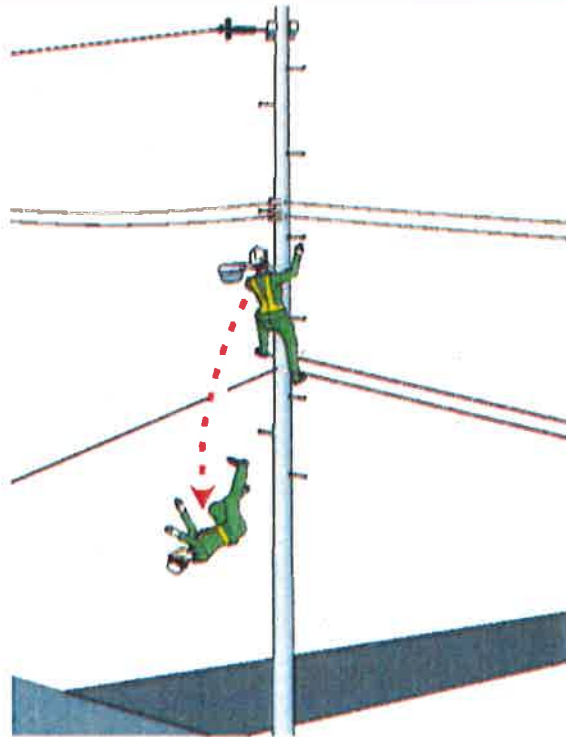

재해발생 원인 및 대책

- 유해·위험작업에 대한 작업방법 개선
 - 시업주는 근로자가 전주에 승주하는 작업방법은 지임하고 고소작업차 또는 활선버킷차를 사용하여 안전하게 작업 할 수 있도록 방법을 개선하는 등의 조치를 하여야 함.
- 승주 작업 중 추락방지를 위한 조치
 - 부득이 근로자가 승주하여 작업을 진행하는 경우, U자 걸이용 안전대의 후크를 걸고 벗길 때 추락방지를 위해 안전대부착설비(안전보조로프)를 병행하여 사용하는 등의 조치를 하여야 함.



재해가 발생한 전주



피재자가 착용했던 보호구
