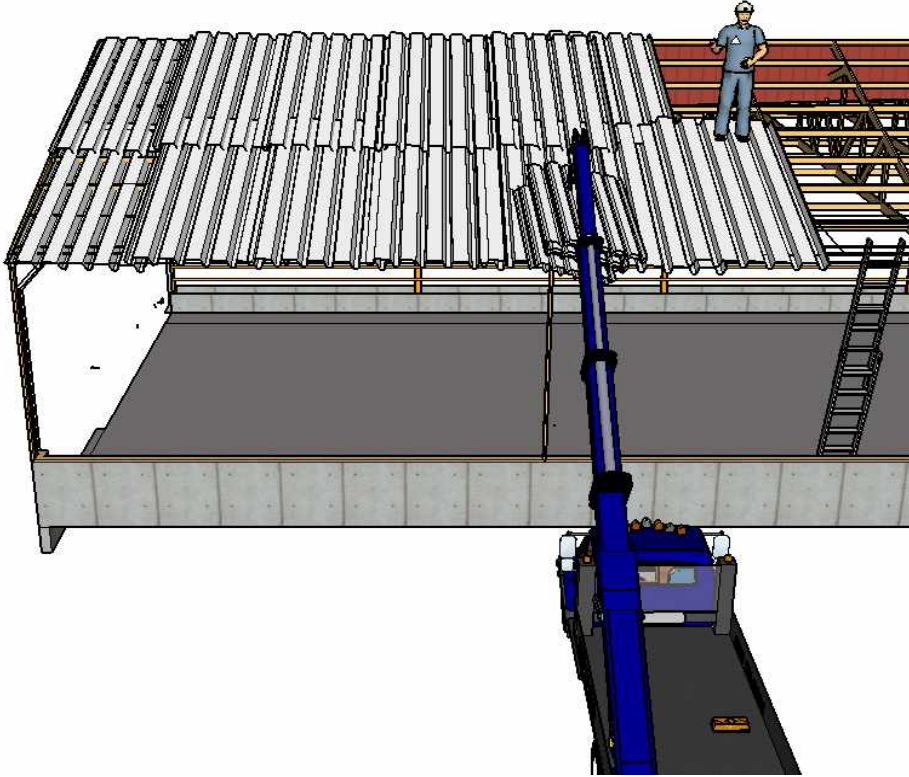


축사지붕 위에서 줄걸이 작업 중 떨어짐			
공 사 명	○○○ 축사	발생일시	2018. 5.
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 소재	공사규모	축사신축
재해개요	2018. 5.경 경북 소재 ○○건업이 시공하는 ○○○ 축사 신축 현장에서 축사 지붕 마감재인 아연도금강판 다발을 5톤 차량탑재형크레인(카고)에 매달아 축사지붕위로 올리는 작업 중, 축사지붕위에서 재해자가 발을 헛디터 콘크리트 바닥으로 떨어져 (h=5.9m) 사망한 사고로 추정됨		
재 해 상 황 도			
축사 지붕위(h=5.9m)에서 발을 헛디터 재해자가 콘크리트 바닥으로 떨어짐 			
안전대책	○ 떨어짐 방지 조치 실시 - 축사 지붕 위(h=5.9m)에서 지붕 설치작업을 함에 있어, 작업 또는 이동시 근로자가 떨어질 우려가 있을 경우에는 작업발판을 설치하거나, 지붕하부에 추락방지망을 설치하여 떨어짐을 방지하여야 함.		
