


압송관 해체 작업 중 떨어짐

공 사 명	오피스텔 신축	발생일시	2020.01.31.(금) 11시 경
재해형태	떨어짐(추락)	재해정도	사망 1명
소 재 지	부산 부산진구 부전동	공사규모	오피스텔 18층 1개동
재해개요	18층 승강기 입구인 슬래브 단부에서 승강기 피트 내 설치된 콘크리트 압송관을 해체하던 중 해체대상 압송관에 연결된 로프가 풀리면서 압송관과 함께 해체 작업자(재해자)가 지하 1층 피트(H : 약 55m)로 떨어진 재해임		

재 해 상 황 도

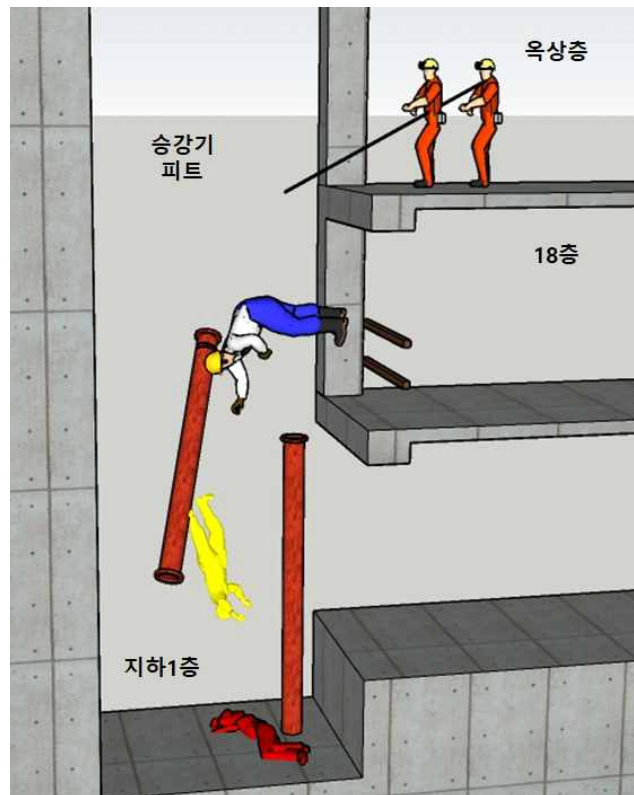

안전대책	○ 승강기 피트 개구부 작업 시 안전대를 착용하고 작업 실시 - 승강기 피트 개구부를 넘어 작업할 경우 안전대를 착용하고 안전대 걸이 시설에 연결후 안전하게 작업을 실시 - (권고) 가급적 승강기 피트에 작업발판 설치하여 작업할 것 ○ 관리감독자의 작업시작 전 점검 사항 확인 - 관리감독자는 압송관 해체작업 전 근로자에 대하여 올바른 자세 및 복장을 점검할 것 ○ 압송관 해제 작업 시 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정 - 해당 작업에 대하여 안전한 작업방법, 떨어짐 위험 예방대책 등을 포함한 작업계획서를 작성하여 그 계획에 따라 작업을 실시 - 작성된 작업계획서에 따라 작업을 지휘하는 지휘자를 지정하여 지휘·감독 하에 작업을 실시
------	--
