


천정 석고보드 작업 중 추락 (사망 1명)

1. 개요

공사명	도시형생활주택 신축공사	발생일시	2023. 4. 15.(토)
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소재지	강동구	공사규모	지하 1층 지상 6층, 1개동
재해개요	재해자가 작업발판 지지목(각재)이 콘크리트에 제대로 고정이 되지 않아 불안정한 작업발판 위에서 계단실 천정 석고보드(명에설치) 작업 중, 작업발판 지지목(각재)이 탈락되며, 작업발판과 함께 계단실 바닥으로 떨어져(h≒3m) 사망함.		

2. 재해상황도

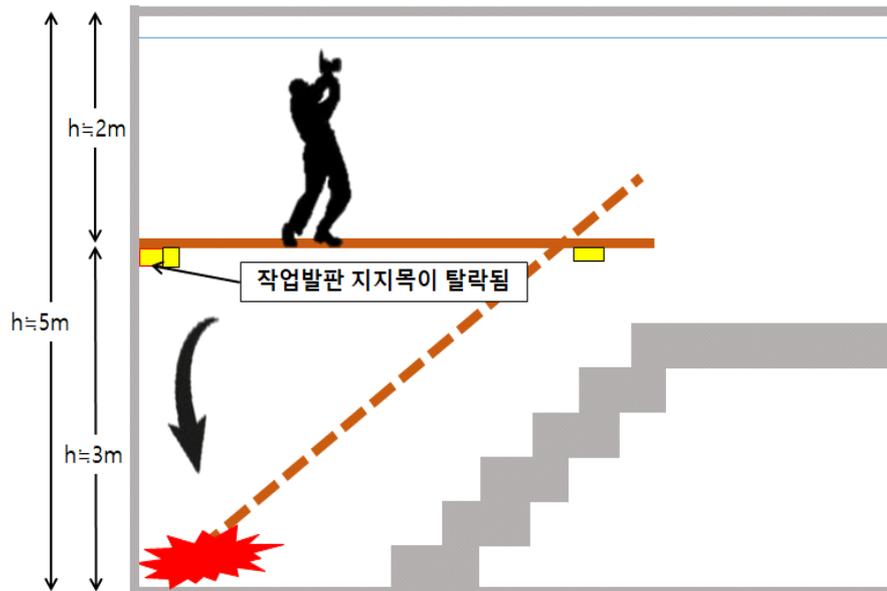

3. 안전대책

○ 안전한 작업발판 설치

- 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 작업하중을 견딜 수 있는 강관비계, 시스템비계 등을 사용하여 튼튼하고 안전한 작업발판을 설치하여야 하며,
- 근로자의 추락 등의 위험을 방지할 수 있도록 **기준에 맞는 구조의 안전난간을 설치**하여야 함.

○ 보호구의 지급

- 사업주는 높이2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 작업할 경우 **안전대, 안전모** 등을 지급하고, **보호구를 착용**하고 작업할 수 있도록 관리감독 하여야 함.

○ 안전보건교육 실시

- 사업주는 근로자가 현장내 최초 근무 시 산업안전 및 사고예방 등에 관한 채용 시 **안전보건교육을 실시**하여야 함.
