


지붕패널 설치 중 추락 [사망 1명]

1. 개요

공 사 명	입출차구간 셔터설치공사	발생일시	2023. 9. 14.(목)
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	성동구	공사규모	지붕패널 인상
재해개요	조립식 지붕패널 재설치 작업 중, 안전대를 걸지 않은 재해자가 비가림판(전날 임시 설치한 패널) 위에서 바닥으로 추락(H=5.7m)하여 사망함.		

2. 재해상황도

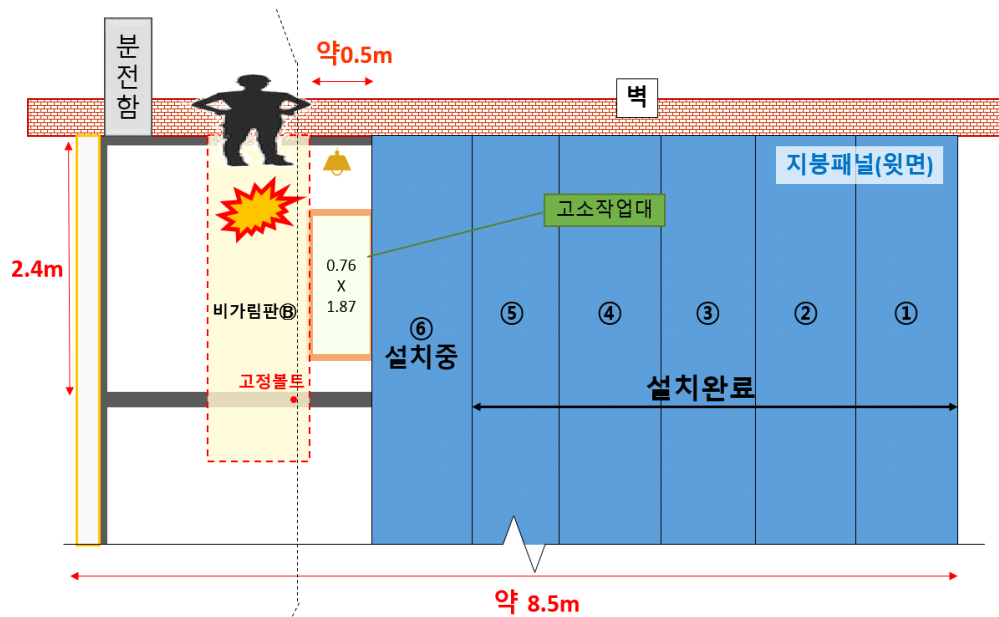

3. 안전대책

○ 고소작업대 작업 중 추락방지조치 준수

- 고소작업대를 상승시킨 상태에서 탑승자가 작업대를 벗어나 지붕 위를 오르내리지 못하도록 하여야 함.
- 지붕 위로 이동하기 위해서는 통로(주변 건물, 이동식비계, 건물 내·외부 비계, 워킹타워 등)를 구축하여 사용하여야 함

○ 추락방호조치 실시 등

- 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 비계를 조립하는 방법으로 작업발판을 설치하여야 함
- 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 추락방호망을 설치하여야 함
- 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자가 안전대를 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 하고, 작업 시작 전 이상 유무를 점검하고 조치하여야 함.
