


형틀목공이 갱폼 해체작업 중 갱폼과 함께 떨어짐

공 사 명	주택재건축정비사업	발생일시	2017.01.05(목) 13:56경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 구미시	공사규모	지하 2층, 지상 20층 7개동
재해개요	2017.01.05(목) 13:56경 경북 구미시 소재 주택재건축정비사업현장에서 협력업체 소속 재해자가 아파트 107동 4호세대 14층 옥상 전면부 발코니에 설치되어 있던 갱폼(작업발판일체형 거푸집)을 해체하기 위해 타워크레인에 매달기를 하지 않은 채, 갱폼 작업발판에 올라가서 갱폼을 지지하고 있는 하부 고정볼트를 해체하던 중 갱폼과 함께 약 45m 아래 지상바닥으로 떨어져 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

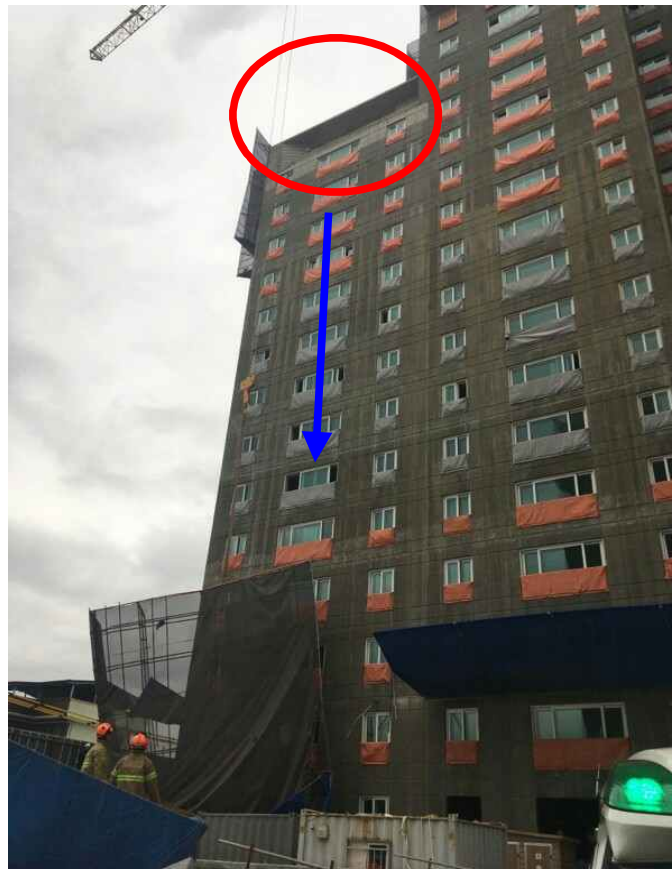

안전대책

- 갱폼(작업발판 일체형 거푸집)의 안전조치 준수 철저
- 갱폼을 해체하는 경우에는 갱폼을 타워크레인에 인양고리 매달기작업 후 하부 고정볼트 해체작업을 하여야 한다.
- 작업계획서에 의거 작업지휘자의 지휘에 따라 해체작업을 하여야 한다.
