


00000증축공사 중 떨어짐

공 사 명	00종합건설(주) 00 00000 증축공사	발생일시	2019.7.9.(화).11:40분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경남 거제시 소재	공사금액	300,000천원

재해개요

- 2019.7.9.(화) 11:40분경 경남 거제시 소재 00000증축공사 현장에서
- 피해자가 건물우측 외부비계 4단 (H≒7.4m) 작업발판 위에서 5단 장선 조립 작업 중
- 발을 헛디뎠 7.4m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어져 사망한 재해임
- ※ 장선 : 비계 기둥 또는 띠장 사이에 걸쳐 작업발판 지지하는 수평재

재 해 상 황 도

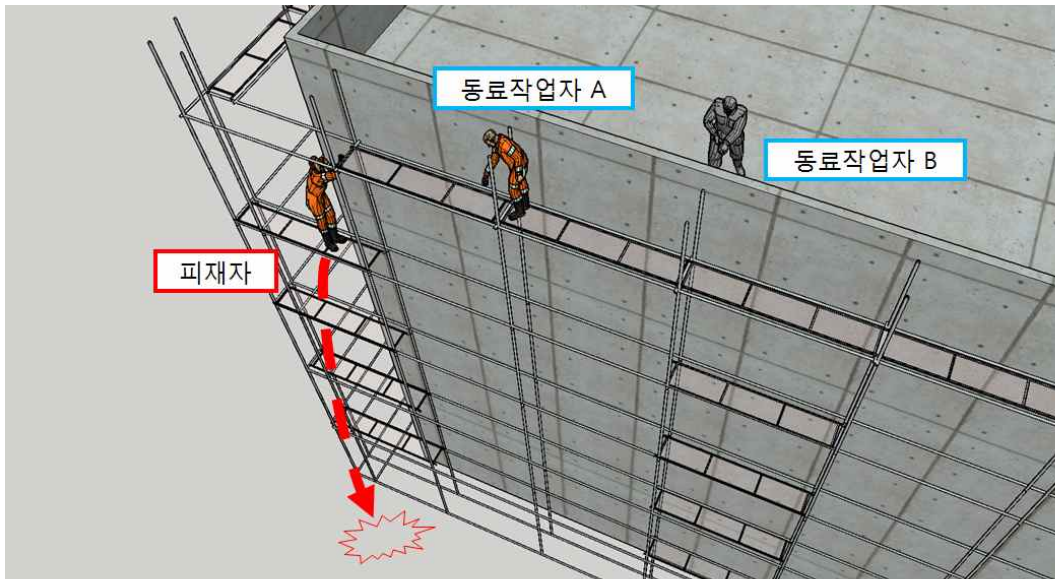

안전대책

- 추락방호조치 실시 철저
 - 사업주는 높이 2m이상에서 비계 설치와 같이 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업할 경우, 안전난간, 수직형 추락방망 등의 방호조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 함.
- 안전모 안전대 등 개인보호구 지급 및 착용관리 철저
 - 사업주는 높이 2m이상에서 비계 설치와 같이 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업할 경우, 근로자에게 안전모와 안전대를 지급하고 착용하도록 관리하여야 함.
