


## 에어컨 자재 운반 중 떨어짐

공사명	○○ ○○○ ◇◇◇ 오피스텔 신축공사	발생일시	2020.03.09.(월) 08:53분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	○○광역시 ○○○ ○○면	공사규모	지하6층, 지상28층 1개동
재해개요	<p>○ 2020.03.09.(월) 08:53분경 ○○ ○○군 ○○면 소재 (주)△△△△△ ○○○○○ ◇◇◇ 오피스텔 신축공사 현장에서 에어컨 설치 업체인 (주)□□□□□ 소속 재해자(설비공)가 지상 27층 각 세대 에어컨 배관작업을 위해 에어컨 자재를 24층에서 27층으로 운반 하던 중,</p> <p>○ 지상 26층 계단실 주변 개구부에서 높이 약 23m 아래 지상 18층 옥외 데크 콘크리트 바닥으로 떨어져 사망한 재해임.</p>		

### 재해상황도

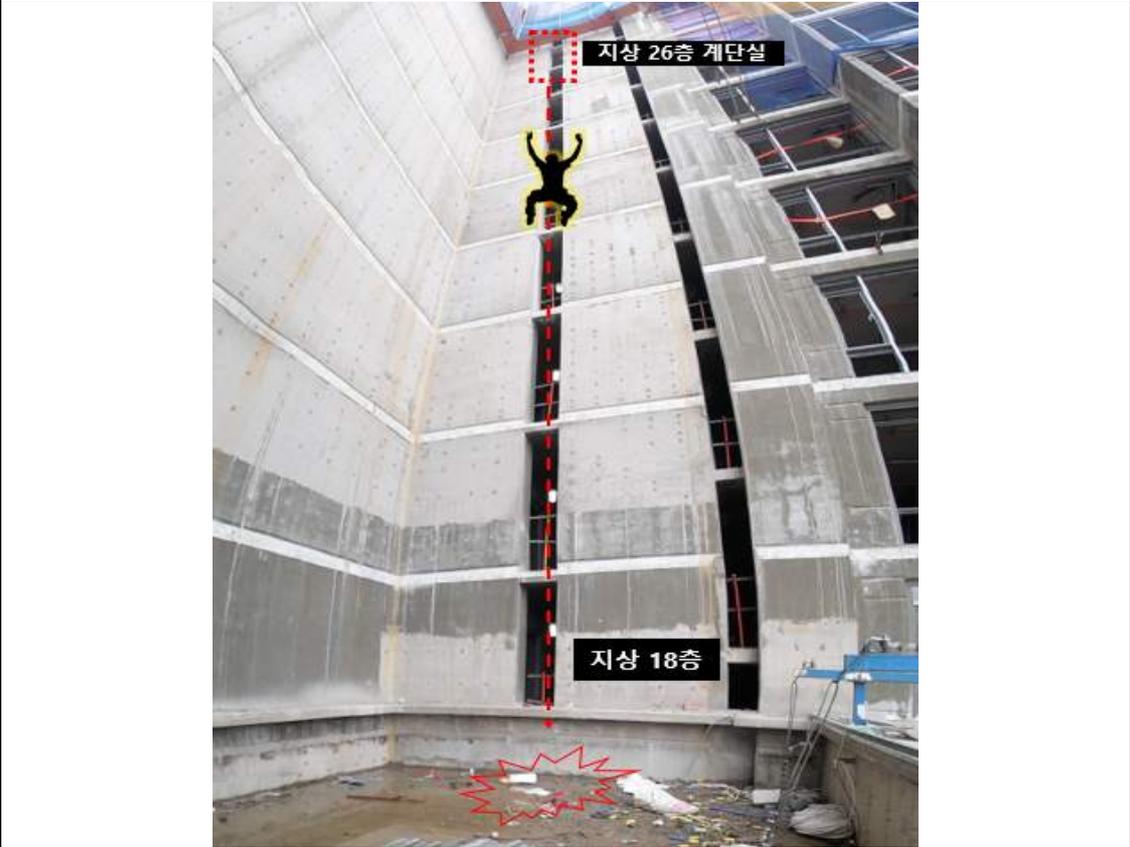

안전대책	<p>○ 계단실 단부 떨어짐 방지 조치 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업주는 할석 및 미장작업을 위해 해체한 안전난간을 작업이 완료되는 즉시 100kg 이상의 수평하중을 견딜 수 있는 구조로 견고하게 재 설치한 후 에어컨 운반 작업을 실시하여야 함.</li> </ul>
------	--
