
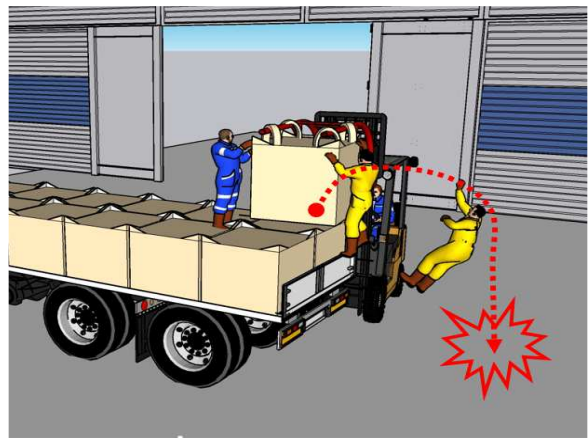


## 톤백용 지게차 덩발에 톤백고리를 걸어주는 작업 중 2.3m 아래 지면으로 떨어져 사망 [사망1]

|       |                                                                                                                                                              |      |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 공 정 명 | (주)OO 톤백 운반작업                                                                                                                                                | 발생일시 | 2023. 7. 3.(월) 14:48경 |
| 재해형태  | 떨어짐                                                                                                                                                          | 재해정도 | 사망 1명                 |
| 소 재 지 | 전북 김제시(재해발생: 정읍시)                                                                                                                                            | 공사규모 | -                     |
| 재해개요  | '23.07.03.(월) 14:48경, 전북 김제시 소재, (유)** 소속 근로자가 양곡창고에서 화물트럭(25톤) 적재함에 실린 톤백 위에서 지게차 보조장치인 톤백용 지게차 덩발에 톤백고리를 걸어주는 작업을 하던 중, 톤백 위에서 약 2.3m 아래 지면으로 떨어져 사망한 재해임. |      |                       |

### 재 해 상 황 도

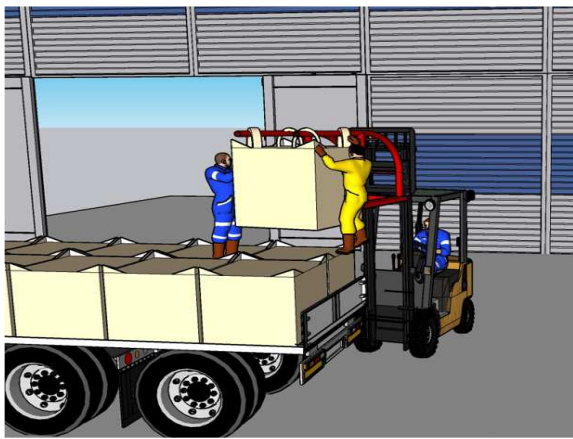

톤백고리를 지게차 덩발에 걸어주는 작업

차량에서 2.3m아래로 떨어짐

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전대책 | <p>○ 작업계획서 작성(중량물 취급 작업, 차량계 하역운반기계 사용 작업)</p> <p>- 중량물 취급 작업, 지게차 및 화물자동차 사용 작업을 할 경우 운행 경로, 작업 방법 및 순서, 안전사고 예방대책 등이 반영된 작업계획서를 작성하여야 함.</p> <p>○ 유도자(또는 작업지휘자) 배치</p> <p>- 지게차를 사용하는 중량물(톤백) 하역 작업 시 유도자(또는 작업지휘자)를 지정 및 배치하여야 함.</p> <p>○ 떨어짐 방호 조치 실시</p> <p>- 근로자가 화물 위로 올라가 작업하는 경우 추락방지시설에 안전로프를 걸고 작업을 하는 등 근로자가 떨어질 위험을 방지하여야 함.</p> <p>○ 위험성평가 작성 및 이행 철저</p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
