


갱폼 인양작업 중 갱폼 측면 단부에서 떨어짐

공사명	○○동 ○○ 신축공사	발생일시	2019.04.11.(목) 15:00경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	인천시 남동구	공사규모	지하2층 지상11층 1개동
재해개요	2019. 04. 11.(목) 15:00경 ○○산업주가 시공 중인 인천 남동구 소재 「○○신축공사」 현장에서 협력업체 (주)○○건설 소속 근로자 ○○○(만 47세, 남, 형틀공)이 지상7층 외부에 설치되어 있던 갱폼을 8층으로 인양작업 중 갱폼 측면 단부에서 지상 1층 바닥(H≒36m)으로 떨어져 병원으로 후송하였으나 당일 15:23경 사망		

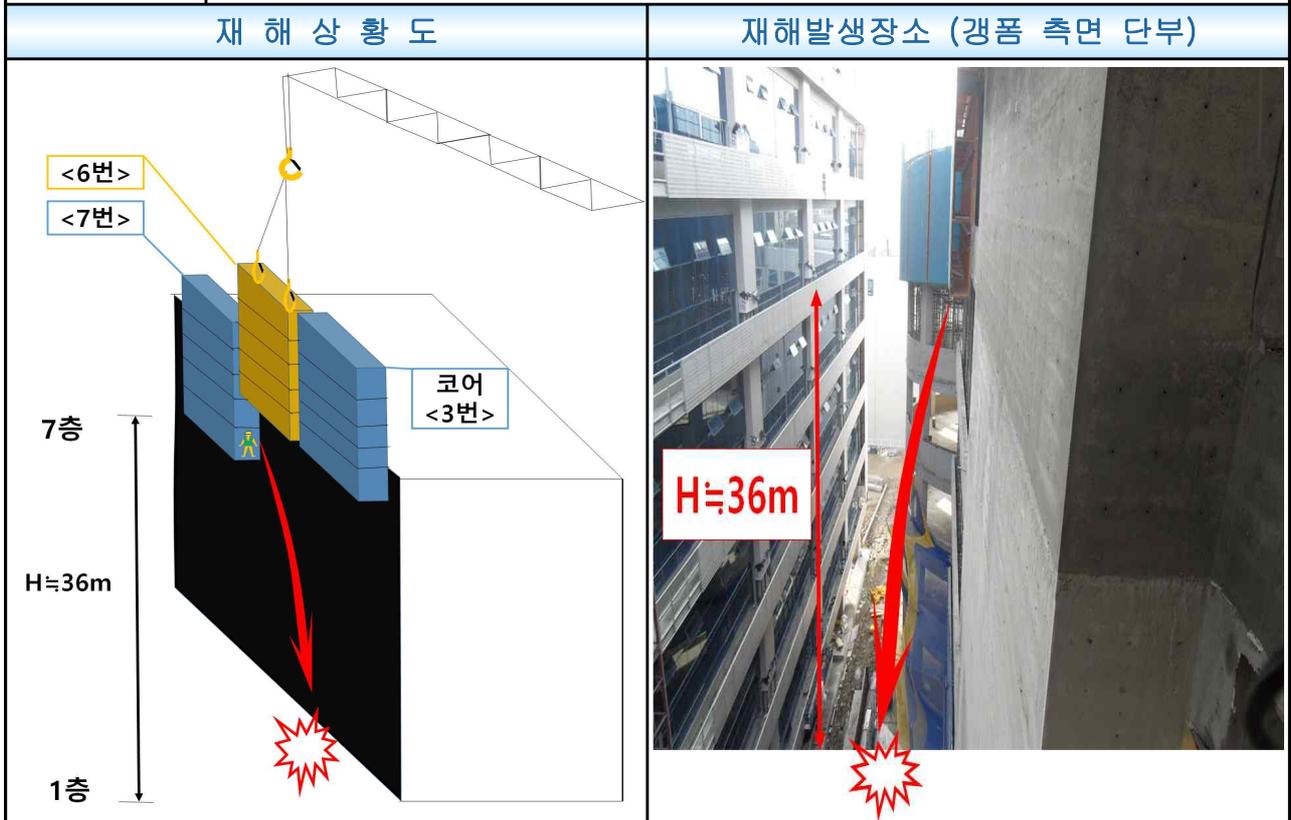

안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개구부 등의 방호조치 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 갱폼 인양 시 측면 단부 등 작업발판의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간 등의 방호 조치를 하여야 함 - 난간등을 설치하는 것이 매우 곤란하거나 임시로 난간등을 해체 하여야 하는 경우 추락방호망을 설치하거나 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 착용·체결하여야 함 ○ 중량물 취급 작업계획서 작성 및 준수 <ul style="list-style-type: none"> - 갱폼 등 중량물 취급작업 시 추락 등 근로자의 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하고, 그 내용을 해당 근로자에게 알린 후 그 계획에 따라 작업을 하여야 함 ○ 작업지휘자의 작업지휘 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 갱폼 등 중량물 취급작업 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 함
------	---
