


거꾸집 해체작업 중 떨어짐, 사망 1명

공 사 명	OOO 다가구주택 신축공사	발생일시	2016.10.15(토) 13:20분
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	대전광역시 서구 △△동	공사규모	지상 5층 다가구주택 신축
재해개요	2016. 10. 15(토) 13:20분 경, 대전광역시 서구 탄방동 소재 「OOO 다가구주택 신축공사」 현장에서, 근로자 정▲▲(58세, 남)이 건물 5층 파라펫 내측 거꾸집 해체작업 도중(추정) 몸의 균형을 잃고 떨어져 병원으로 후송·치료 받던 중 2017. 3. 20(월)에 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

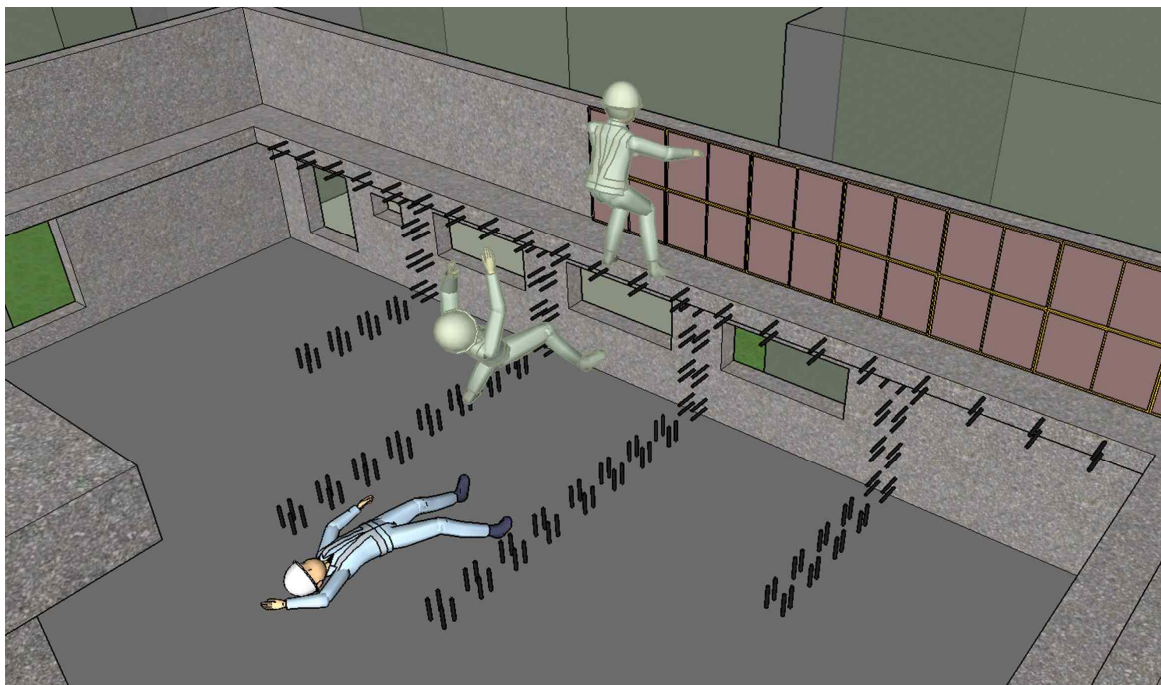

○ 재해예방대책

- 고소작업 시 강관비계 조립 등을 통한 작업발판 확보 및 안전난간 설치 철저
- 거꾸집 해체 작업은 근로자 넘어짐, 떨어짐 재해가 발생할 확률이 높은 만큼 작업 구간 내에 강관비계 또는 이동식비계 조립을 통하여 작업발판을 설치하고,
- 작업발판 단부에 안전난간(상부 및 중간난간대 구성)을 설치하여 근로자 떨어짐 방지조치를 해야 함.
